

改訂履歴

[illegible]

同志社大学 学生勤務管理システム
プロジェクト計画書

2023/9/6

目 次

1. 目的及び達成事項	．．．	P. 1
2. 期間	．．．	P. 1
3. 成果品	．．．	P. 1
4. 体制図	．．．	P. 2
5. 会議	．．．	P. 4
6. コミュニケーションルール	．．．	P. 4
7. 議事録・課題管理運用ルール	．．．	P. 4
8. スケジュール	．．．	P. 4

1. 目的及び達成事項

学生勤務管理システムの構築

※月々の勤務管理及び承認決裁業務をシステム化し、業務効率化を図る。

2. 期間


2023年9月6日～2024年3月31日

3. 成果品

- (1) 基本設計書、詳細設計書
- (2) プログラム一式
- (3) テスト計画書、テスト結果報告書、脆弱性診断報告書


4. 体制図

■同志社大学様

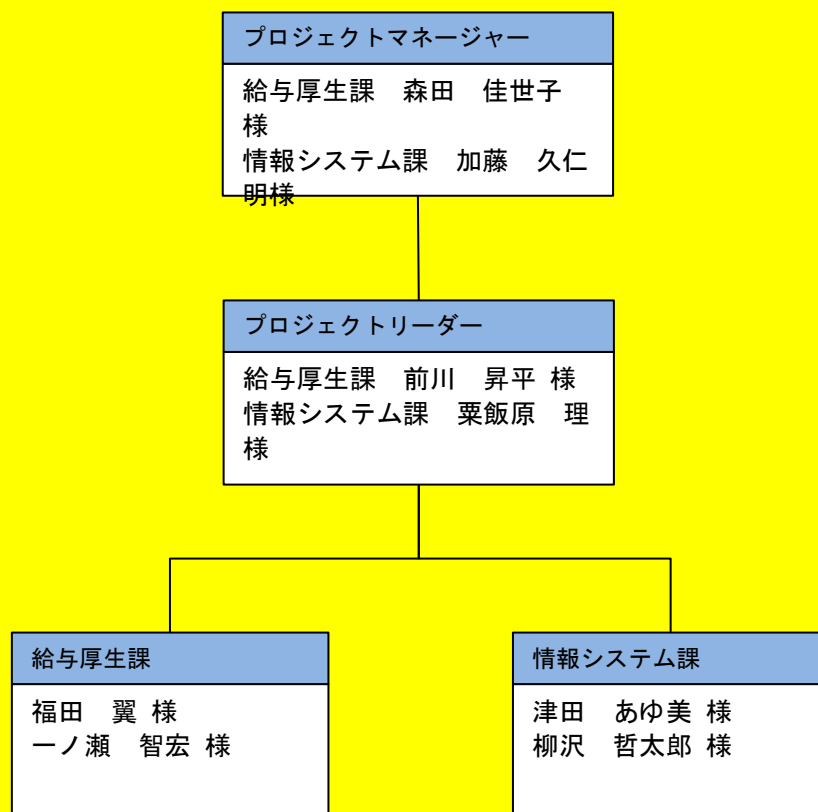

4. 体制図

■ (株)京信システムサービス
ソリューションパートナー事業部アカウントパートナーグループ
(TEL : 075-757-8080)

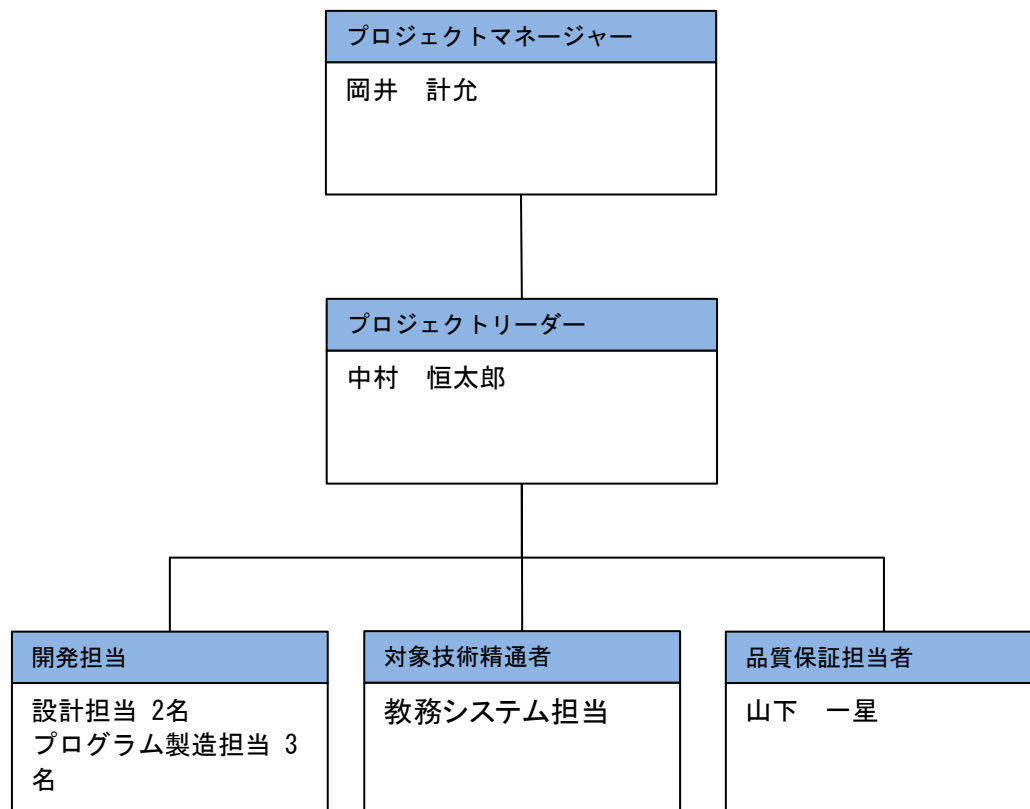

5. 会議

- (1) キックオフ
プロジェクト計画について共有する。
- (2) 要件定義レビュー会議
要件定義書のレビューを行う。
本会議において、要件定義締結とする。
- (3) 基本設計レビュー
基本設計書のレビューを行う。
本会議において、仕様の締結とする。
- (4) 随時打ち合わせ
仕様の打合せ等、必要に応じて実施する。

6. コミュニケーションルール

「5. 会議」以外で、質問・相談・情報共有等のコミュニケーションを行う場合は、メールまたは電話で行うものとする。

メールでコミュニケーションを行う場合は、関係者が登録されたメーリングリストを使用する。

メーリングリスト: db-gknmknr@ml.doshisha.ac.jp

電子ファイルの授受はWebDiskを使用する。

KSS→同志社 データ提供用URL

https://webdisk.doshisha.ac.jp/public/kqYoALeNnNxMq9W2N21B33mE_LOOroNUCxs9BXGy

同志社→KSS データ提供用URL

<https://webdisk.doshisha.ac.jp/public/NqIqApBNnPxlmtYloPb3PKzCnfgDUwxSan1zgUofTfH>

7. 課題管理

- (1) 課題管理について
プロジェクト内で発生する課題は、全て課題管理表に登録して管理する。
 - ① 課題管理の目的
 - ・課題の影響範囲をプロジェクトで共有する。
 - ・残課題の内容、担当者、解消期限等を明確にする。
 - ・課題の解消遅れによるプロジェクト遅延を防止する。
 - ・課題の解消漏れによる後工程での手戻りを防止する。
 - ・課題完了結果の情報をプロジェクトで共有する。
 - ② 課題の解消（完了）条件
 - ・課題が解消され対応が完了したとき。
 - ・課題が、他の課題へ統合されたとき。

8. スケジュール

別紙に示す通りとする。

スケジュール

[illegible]

	貴学作業
	貴学・KSS作業
	KSS作業

スケジュール				作成日： 2023年9月6日																		
作業項目	予定日		担当	1月					2月				3月				4月					
	開始	終了		貴学	KSS	1日の週	8日の週	15日の週	22日の週	29日の週	5日の週	12日の週	19日の週	26日の週	4日の週	11日の週	18日の週	25日の週	5日の週	12日の週	19日の週	26日の週
学生動怠管理システム構築																						
イベント																						

貴学作業

貴学・KSS作業

KSS作業
